

El Metro de Bogotá avanza


29 comité técnico ALAMYS
Movilidad urbana sostenible
Julio de 2024




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Ubicación





* Población fuente: DANE, "Proyecciones nacionales y departamentales de población 2018-2050."

**Fuente otros datos: Invest In Bogotá

Foto: bogota.gov.co



590 km de ciclorrutas
880.000 viajes diarios



* Source and photo: bogota.gov.co

La Red Metro nos Une



TRONCAL

2364
buses

1.936.521
viajes al día

114.4 km
de vía troncal

26 km/h
velocidad promedio



ZONAL

8625
buses

1.960.171
viajes al día

2.330 km
de vía recorridos

16 km/h
velocidad promedio



CABLE

163
cabinas

24.471
viajes al día

3.5 km
de vía recorridos

4 m/s
velocidad promedio



BICI ESTACIONES

(Bici Estaciones
integración modal)

21
Bici estaciones

6499
Cupos


Fuente: TransMilenio





En Bogotá hemos aprendido
a estructurar proyectos
de transporte masivo.

El Metro avanza por una Bogotá que camina segura

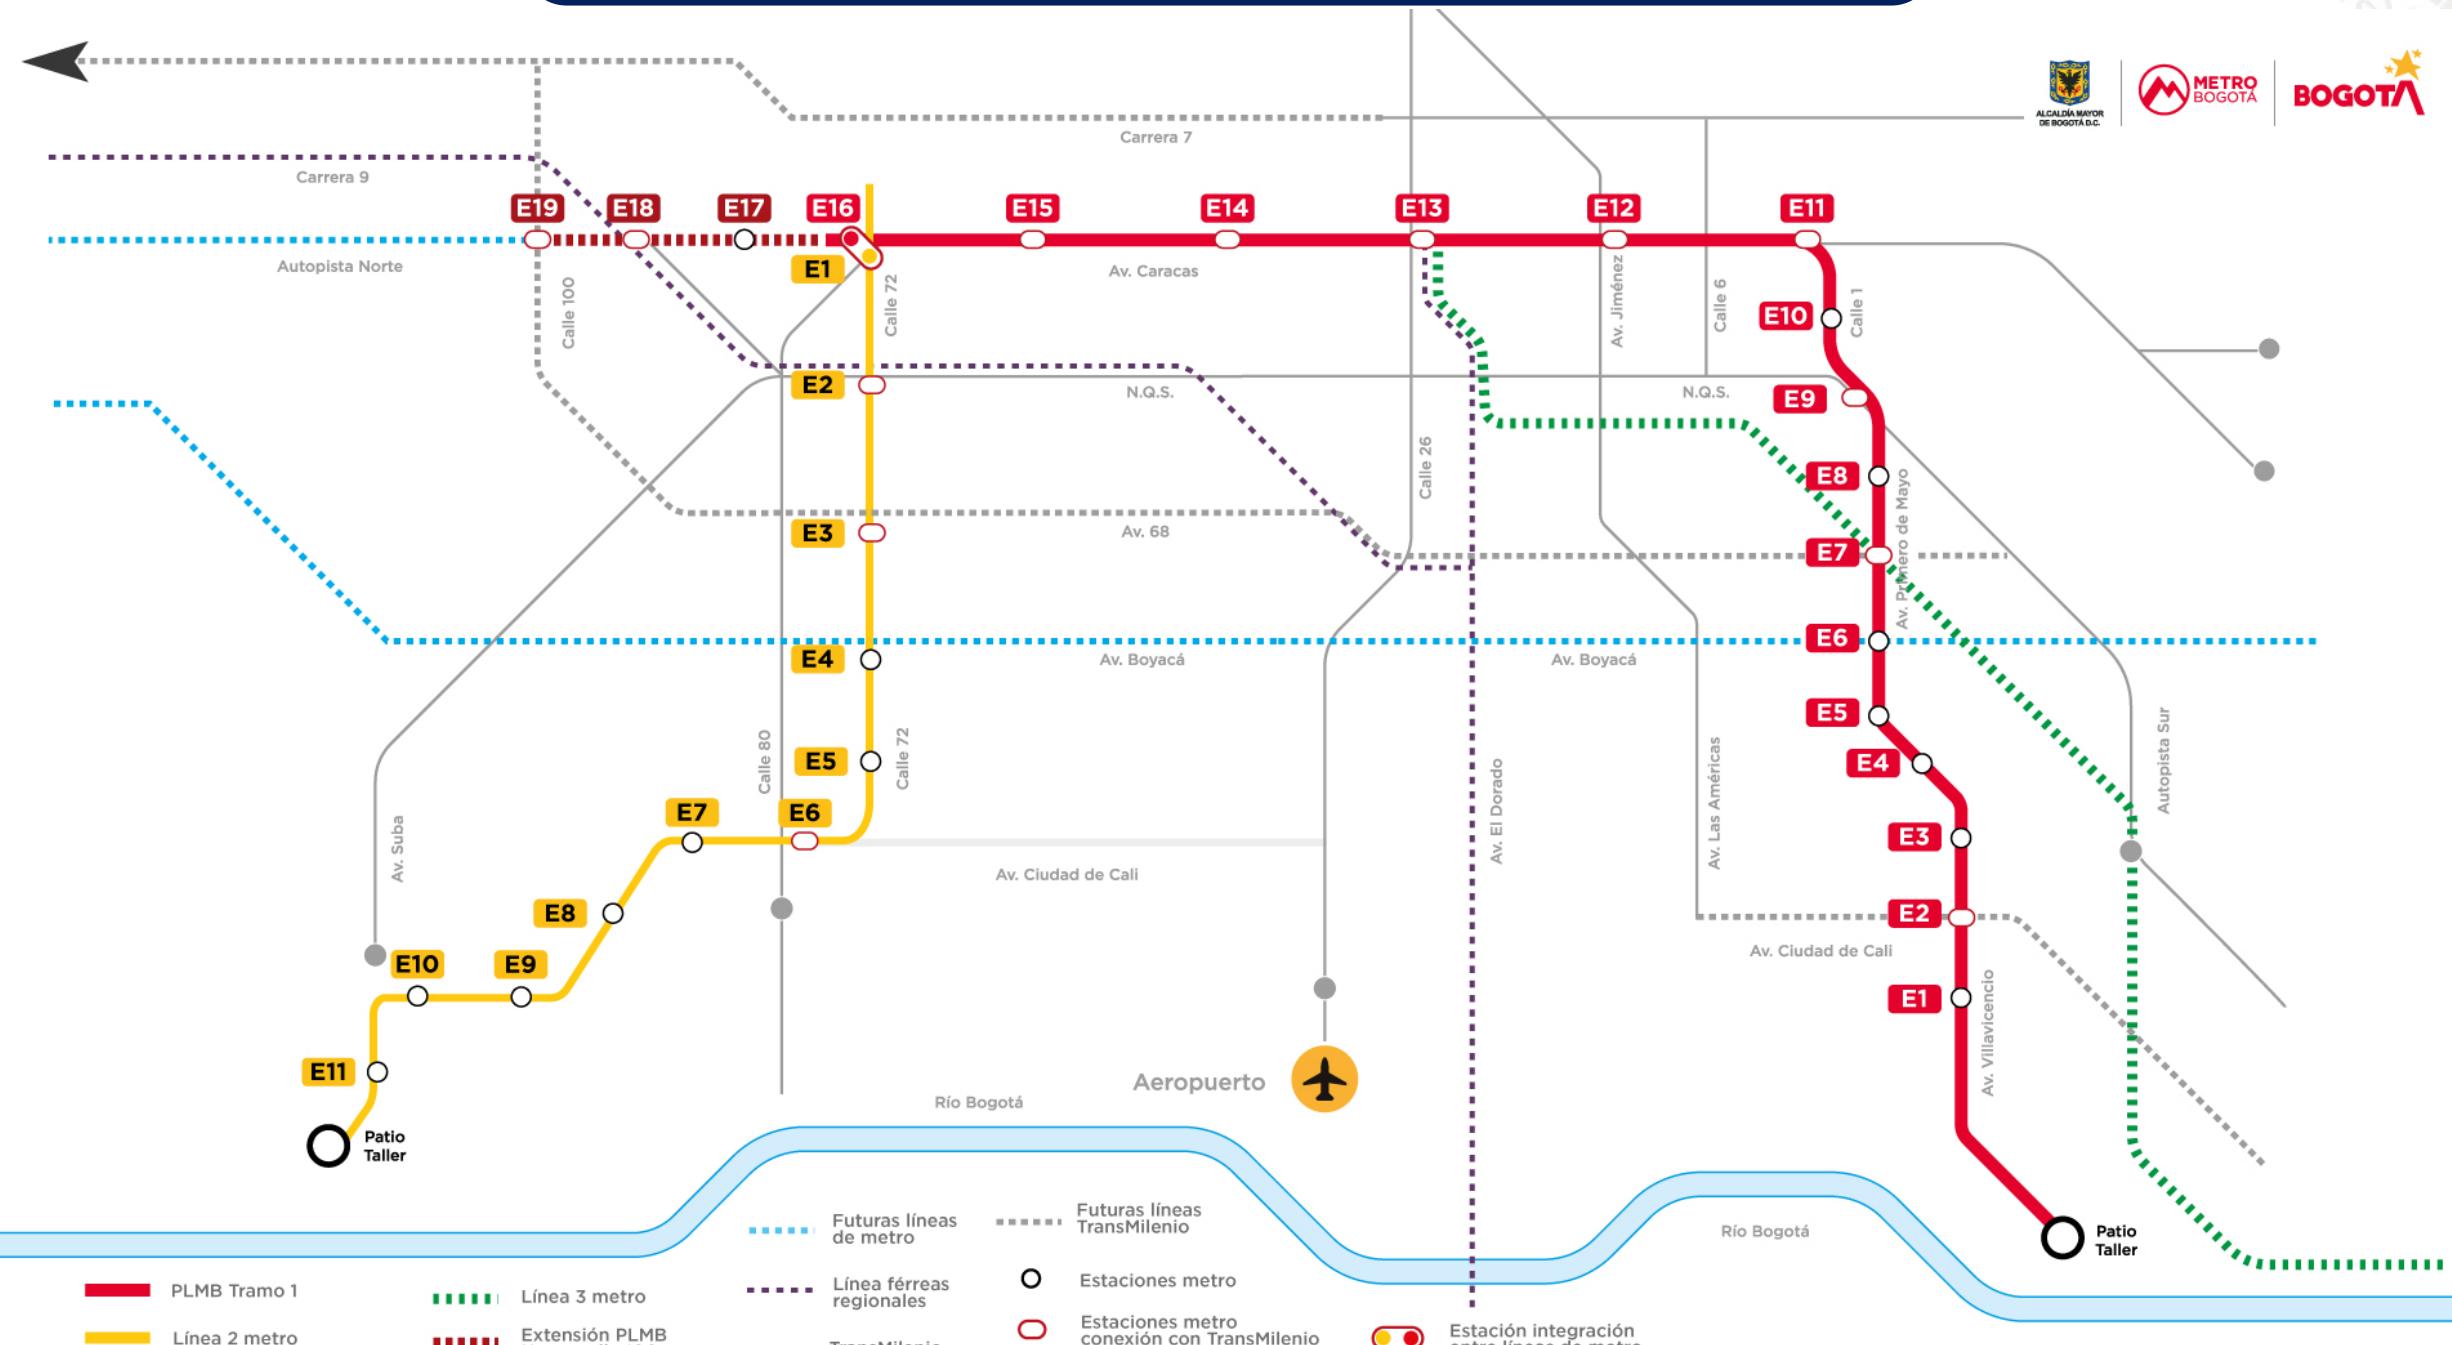

Línea 1
del Metro
de Bogotá



#ElMetroAvanza



CRONOGRAMA PLMB



Etapas del Contrato 163 de 2019

Etapa Preoperativa: Comprende la Fase previa, Fase de Construcción y Fase de pruebas y Puesta en Marcha (octubre 20 de 2020 a marzo 14 de 2028)

Etapa de Operación y Mantenimiento: 20 años de Duración (marzo 15 de 2028 a marzo 15 de 2048)

Etapa de Reversión: 180 días contados a partir de la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento (marzo 15 de 2048 a septiembre 11 2048)



Avance general del Proyecto

Avance al 31 de mayo de 2024



ñ

88.38%

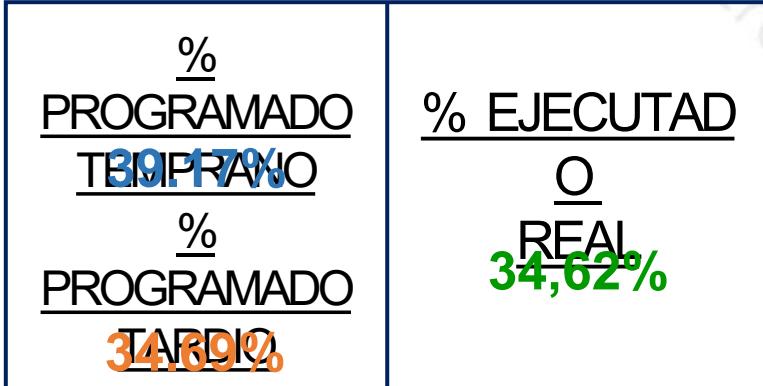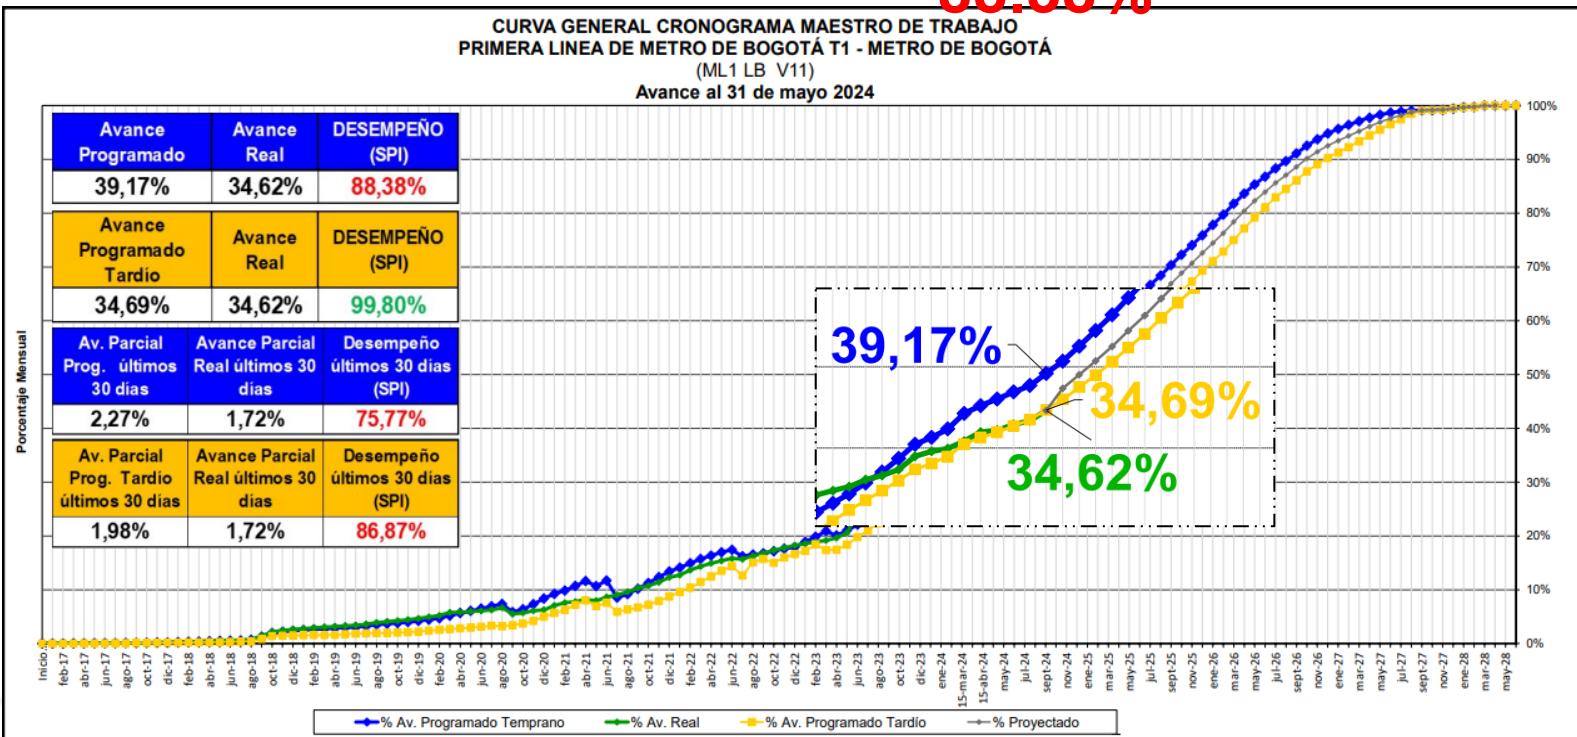

Contrato de Concesión

Temprano: 30,95%
Tardío: 25,96%

Real: 25,78%

Gestión predial

Temprano:
100,00%
Tardío: 98,50%


Real:
98,98%

Gestión TAR

Temprano:
100,00%
Tardío: 100,00%

Real:
100,00%


Edificios administrativos patio taller PLMB

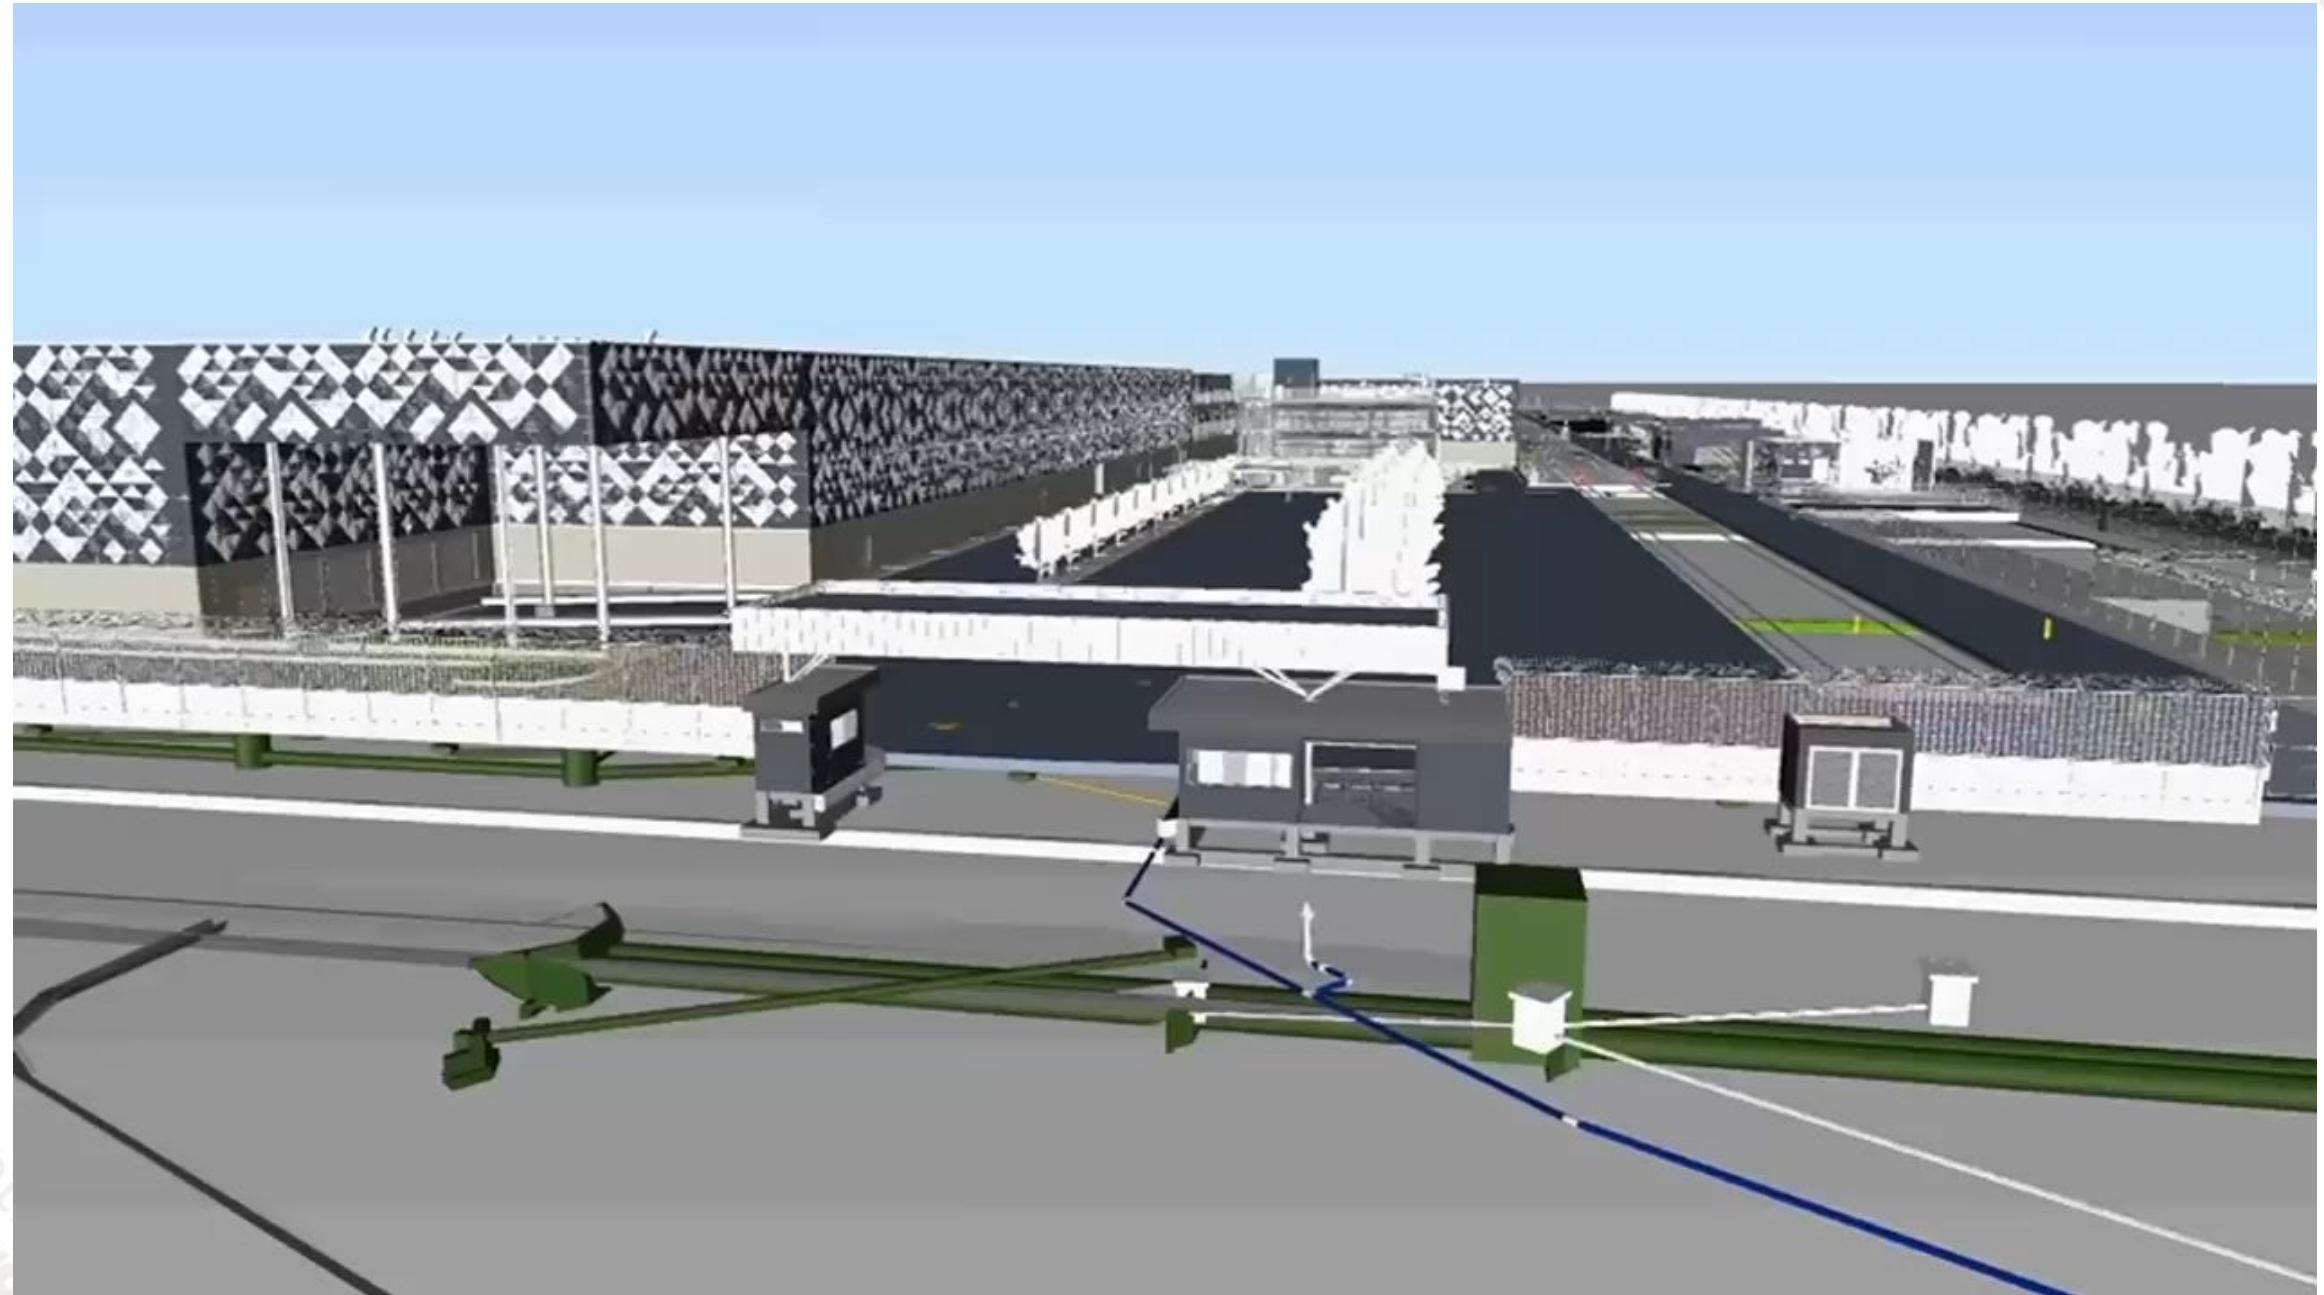

Patio de prefabricados



Avance de UE de viaducto – Avance Cimentaciones al 19 de junio de 2024

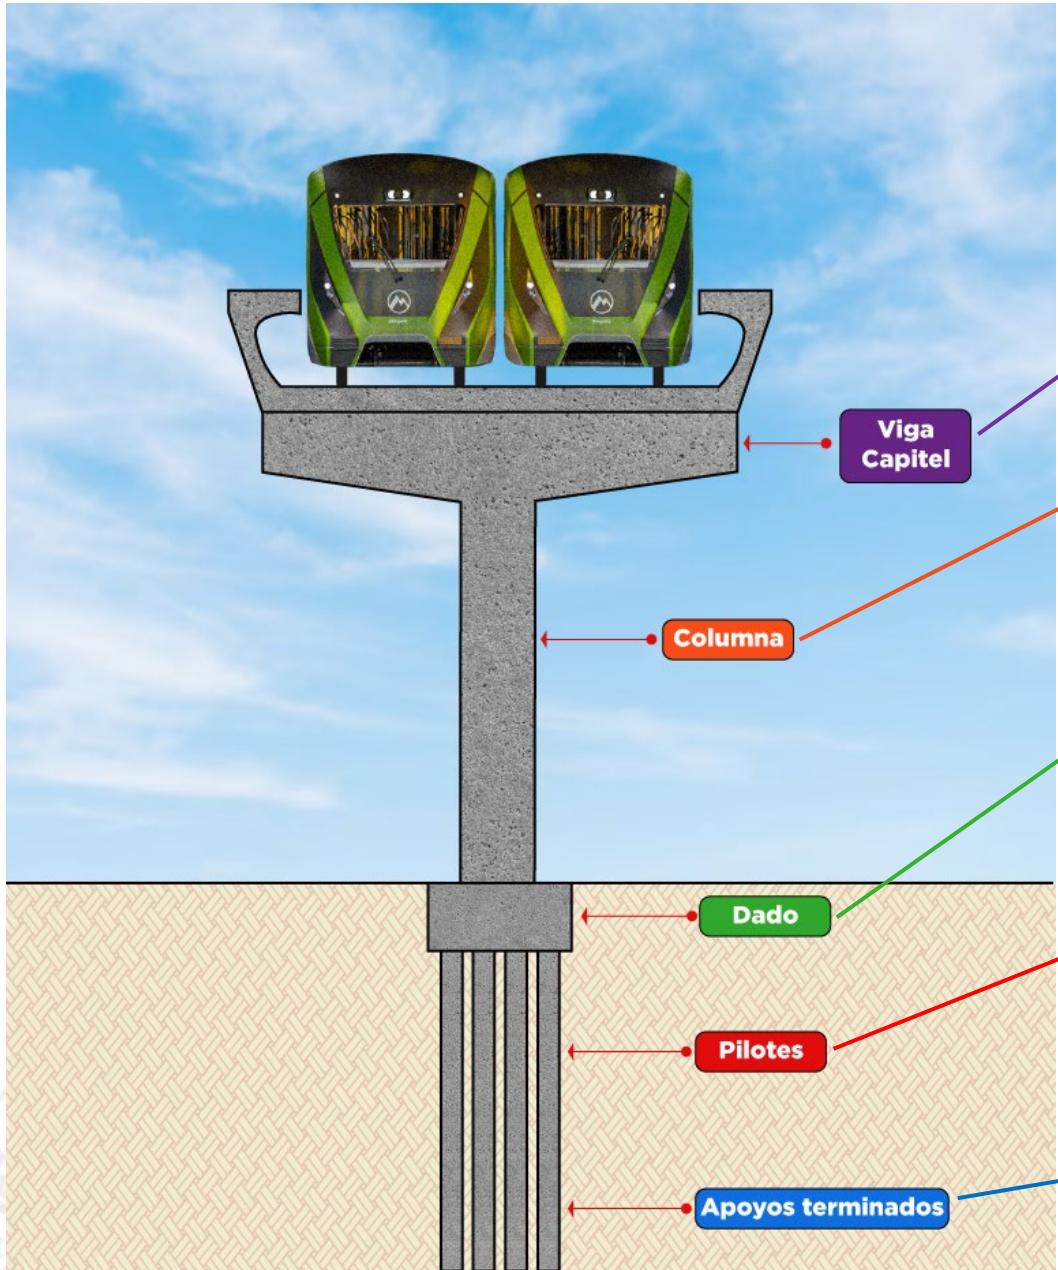

* Cantidades en unidades

Totales 742

Terminadas 31

Totales 917

Terminadas 61

Totales 825

Terminadas 64

PHC

Pretensioned spun High
strength Concrete pile

Pre
excavados

Totales 5.696

Instalados 1.700

Totales 2.401

Construidos 182

Totales 745

Construidos 162

Frente de obra 1 PLMB – Con corte al 19 de junio de 2024



Avance

61 columnas
64 dados
31 vigas capitel



El Metro de Bogotá avanza

CON UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



1 MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA 

2 RESPETARÁ EL MEDIO AMBIENTE 

7 AGILIZARÁ LA MOVILIDAD 


6 INCENTIVARÁ EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 



3 IMPULSARÁ EL DESARROLLO URBANO INTEGRADO A LA MOVILIDAD 

5 ESTIMULARÁ UNA NUEVA CULTURA CIUDADANA 

4 BENEFICIARÁ AL COMERCIO FORMAL 



Video Línea 2 del Metro de Bogotá



Contrato de Concesión

No objeción Bancas
Multilaterales a Lista
de Precalificados

Apertura Licitación
Pública Internacional

Recepción de ofertas

Adjudicación

Acta de Inicio

05/09/2023

18/10/2023

21/08/2024

06/12/2024

Segundo Trimestre
2025

Interventoría y PMO

Solicitud de
Expresión de Interés

Conformación de la
Lista Corta

Recepción de
Propuestas

Adjudicación

Acta de inicio


2024

2025

Segundo Trimestre
2025



Línea 2 Metro de Bogotá

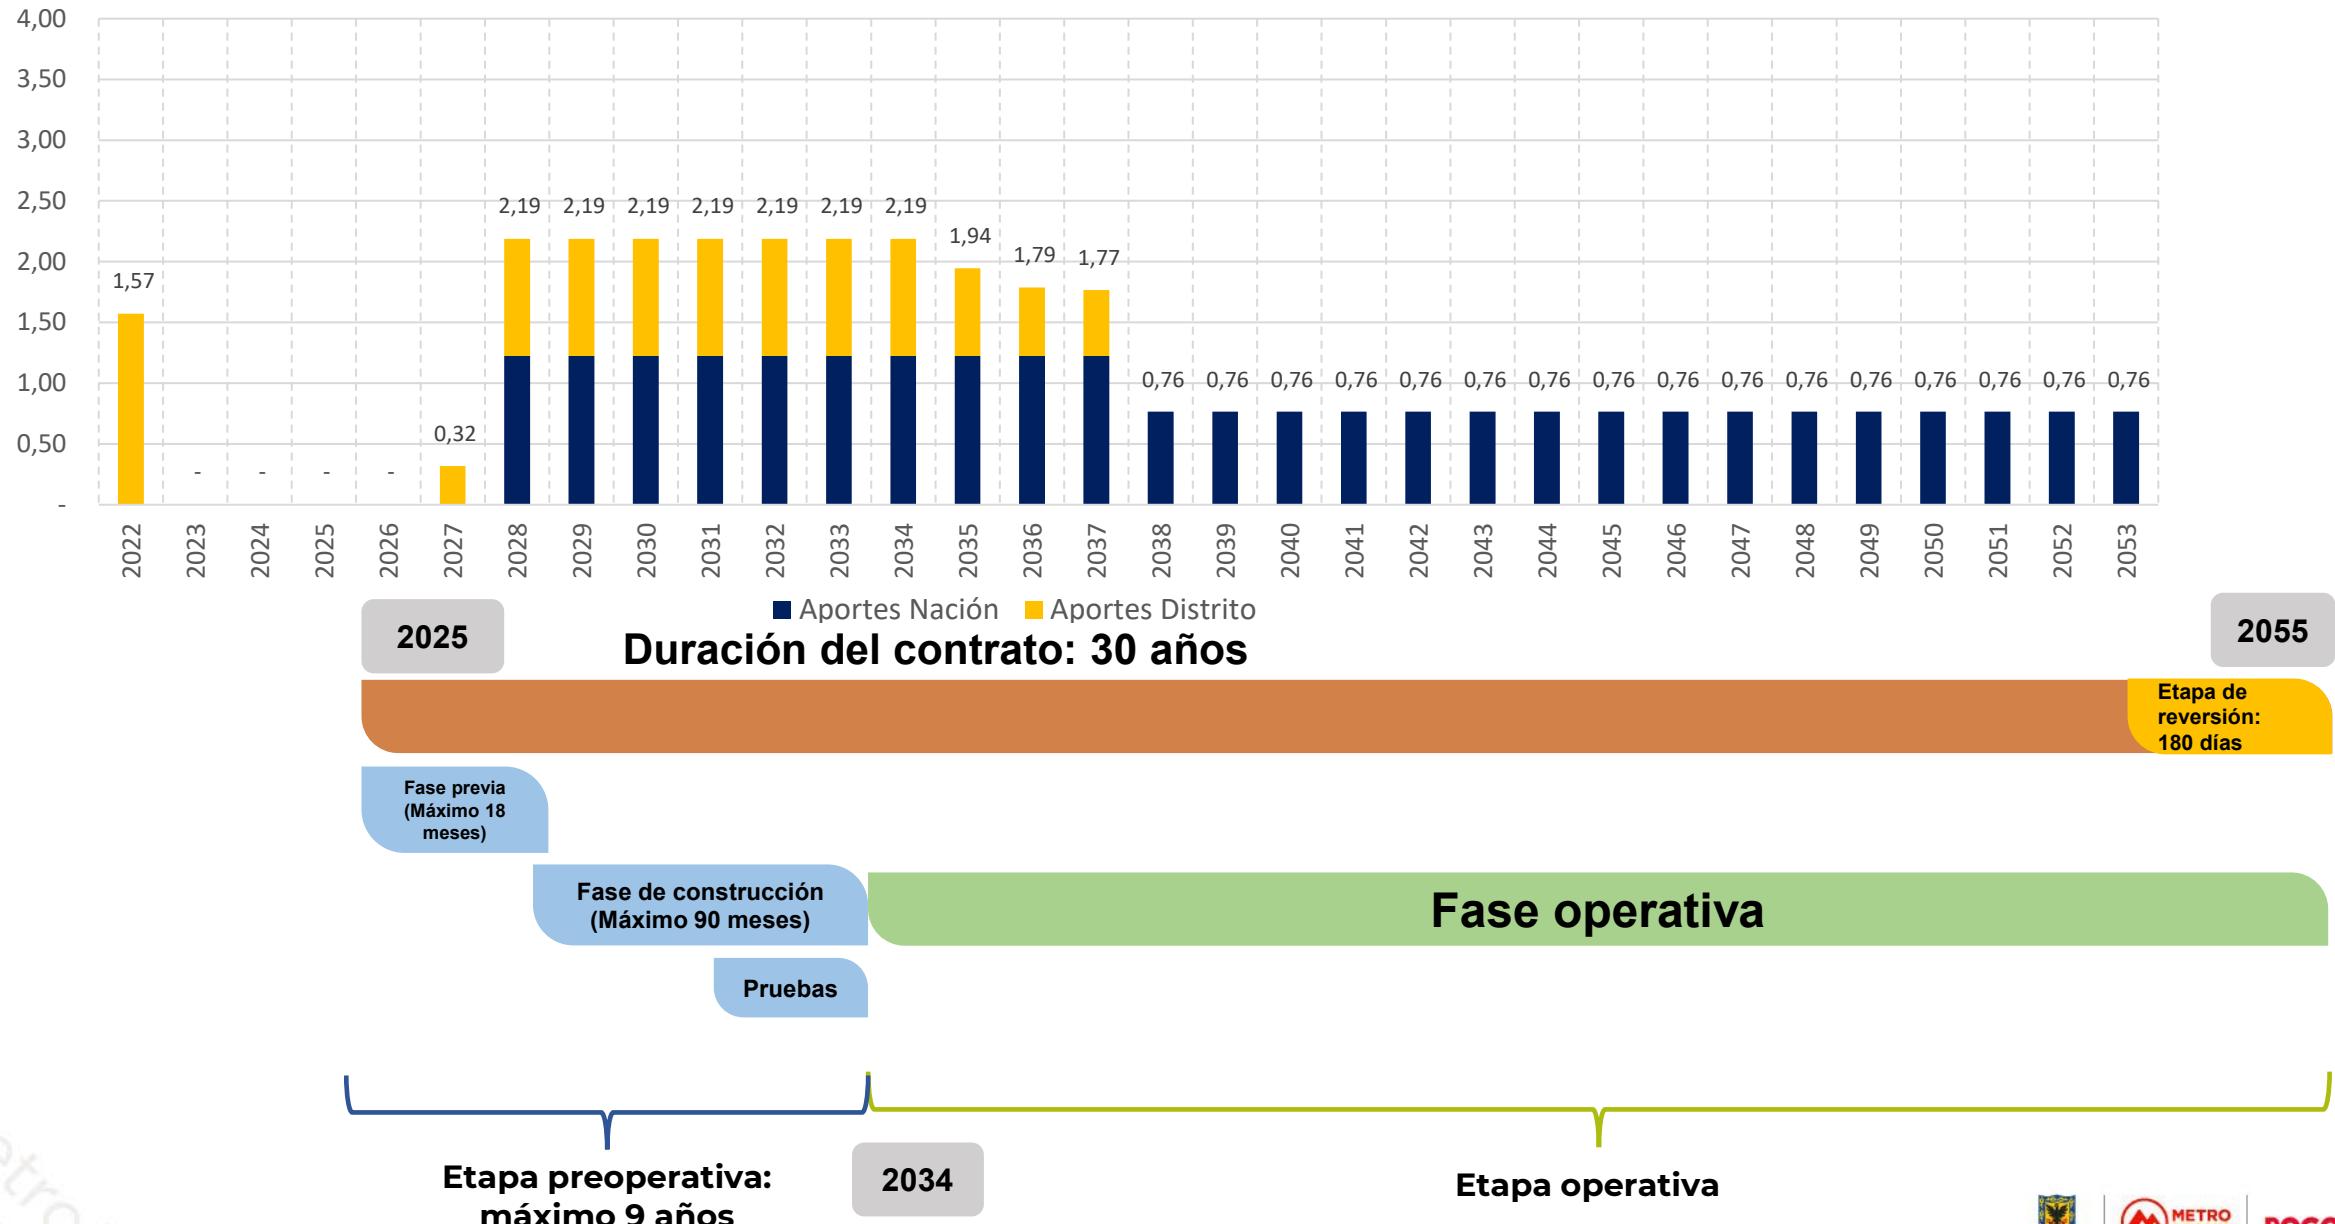

El Metro avanza
por una Bogotá
que camina segura

